

COMMITTENTE:



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di POTENZA

REGIONE BASILICATA

"REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ED UN'ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA "
FONDI FEARS 2014-2020 ASSE 5 - AZIONE 6A.6.1.2
REGIONE BASILICATA DIP.TO AMBIENTE ED ENERGIA

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MOLITERNO VIA ISTRIA - CENTRO URBANO

PROGETTO DEFINITIVO

05.00.00_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA :

1:varie

PROGETTISTA: Geom. Vincenzo DOTI

GIUGNO 2021

STRUTTURE: Ing. Michele ALBANO

GEOLOGIA: Geol. Rocco SPAGNUOLO

File:

ALLEGATO "A"

Comune di MOLITERNO
Provincia di Potenza

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOCALITA'
VIA ISTRIA
PROGETTO DEFINITIVO
COMMITTENTE: Comune di Moliterno.
CANTIERE: Via Istria, MOLITERNO (Potenza)

MOLITERNO, 28/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Doti Vincenzo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP - Geometra UTC Mastrangelo Giuseppe)

Geometra Doti Vincenzo

Via G. Amendola, 226
85047 Moliterno (PZ)
Tel.: 097567150 - Fax: 097567150
E-Mail: info@vdoti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2	01/09/2021	02/09/2021
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	2	2	02/09/2021	03/09/2021
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	06/09/2021	07/09/2021
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	08/09/2021	09/09/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	09/09/2021	10/09/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	13/09/2021	14/09/2021
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	14/09/2021	14/09/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	15/09/2021	16/09/2021
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	2	16/09/2021	17/09/2021
LAVORI MOVIMENTO TERRA						
Tracciamenti e risezionamenti						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	3	3	20/09/2021	22/09/2021
Protezione degli scavi						
Scavi di sbancamento						
Scavo di sbancamento	1	E	15	19	20/09/2021	08/10/2021
Scavi a sezione obbligata						
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	11/10/2021	15/10/2021
LAVORI STRADALI						
Sede stradale						
Formazione di rilevato stradale	1	E	5	5	18/10/2021	22/10/2021
Formazione di fondazione stradale	1	E	9	12	25/10/2021	05/11/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	24/01/2022	28/01/2022
Opere d'arte						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	08/11/2021	12/11/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	08/11/2021	12/11/2021
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	5	15/11/2021	19/11/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	5	5	22/11/2021	26/11/2021
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	5	5	29/11/2021	03/12/2021
Opere complementari						
Posa di segnaletica verticale	1	E	4	4	14/02/2022	17/02/2022
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	3	3	16/02/2022	18/02/2022
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	25/02/2022	25/02/2022
LAVORI DI URBANIZZAZIONE						
ACQUEDOTTI						
Posa di condotta idrica in materie plastiche	1	E	2	2	27/12/2021	28/12/2021

Tabella Analitica Gantt

FOGNATURE						
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	3	3	29/12/2021	31/12/2021
IMPIANTI A RETE						
Opere d'arte						
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	5	5	13/12/2021	17/12/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	5	20/12/2021	24/12/2021
Impianti a rete						
Posa di condotta elettrica	1	E	4	4	10/01/2022	13/01/2022
Posa di condotta idrica	1	E	1	1	21/12/2021	21/12/2021
Posa di condotta fognaria	1	E	1	1	27/12/2021	27/12/2021
Esecuzione di protezioni elettriche	1	E	4	5	03/01/2022	07/01/2022
VASCHE IN C.A.						
Posa di fossa biologica prefabbricata	1	E	3	3	10/01/2022	12/01/2022
OPERE EDILI IN GENERE						
Massetti e sottofondi						
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	5	5	17/01/2022	21/01/2022
Opere in c.a. non strutturale						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	29/11/2021	29/11/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	1	1	29/11/2021	29/11/2021
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	1	1	29/11/2021	29/11/2021
Opere in legno e ferro						
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	1	1	06/12/2021	06/12/2021
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	1	1	06/12/2021	06/12/2021
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1	E	2	2	06/12/2021	07/12/2021
Pavimentazioni industriali						
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	1	E	1	1	06/12/2021	06/12/2021
LAVORI STRUTTURALI						
CEMENTO ARMATO						
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	4	4	11/10/2021	14/10/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	4	4	11/10/2021	14/10/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	15/10/2021	15/10/2021
ACCIAIO						
Strutture principali in acciaio						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	4	4	02/11/2021	05/11/2021
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	5	5	08/11/2021	12/11/2021
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	5	5	15/11/2021	19/11/2021
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ESTERNA						
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	3	3	27/12/2021	29/12/2021
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	3	3	29/12/2021	31/12/2021
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	3	3	10/01/2022	12/01/2022
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	2	2	13/01/2022	14/01/2022
LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA						
Rinverdimenti						

Tabella Analitica Gantt

Messa a dimora di talee e piantine	1	E	5	5	07/02/2022	11/02/2022
Scavi e riprofilature del terreno						
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	5	5	31/01/2022	04/02/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

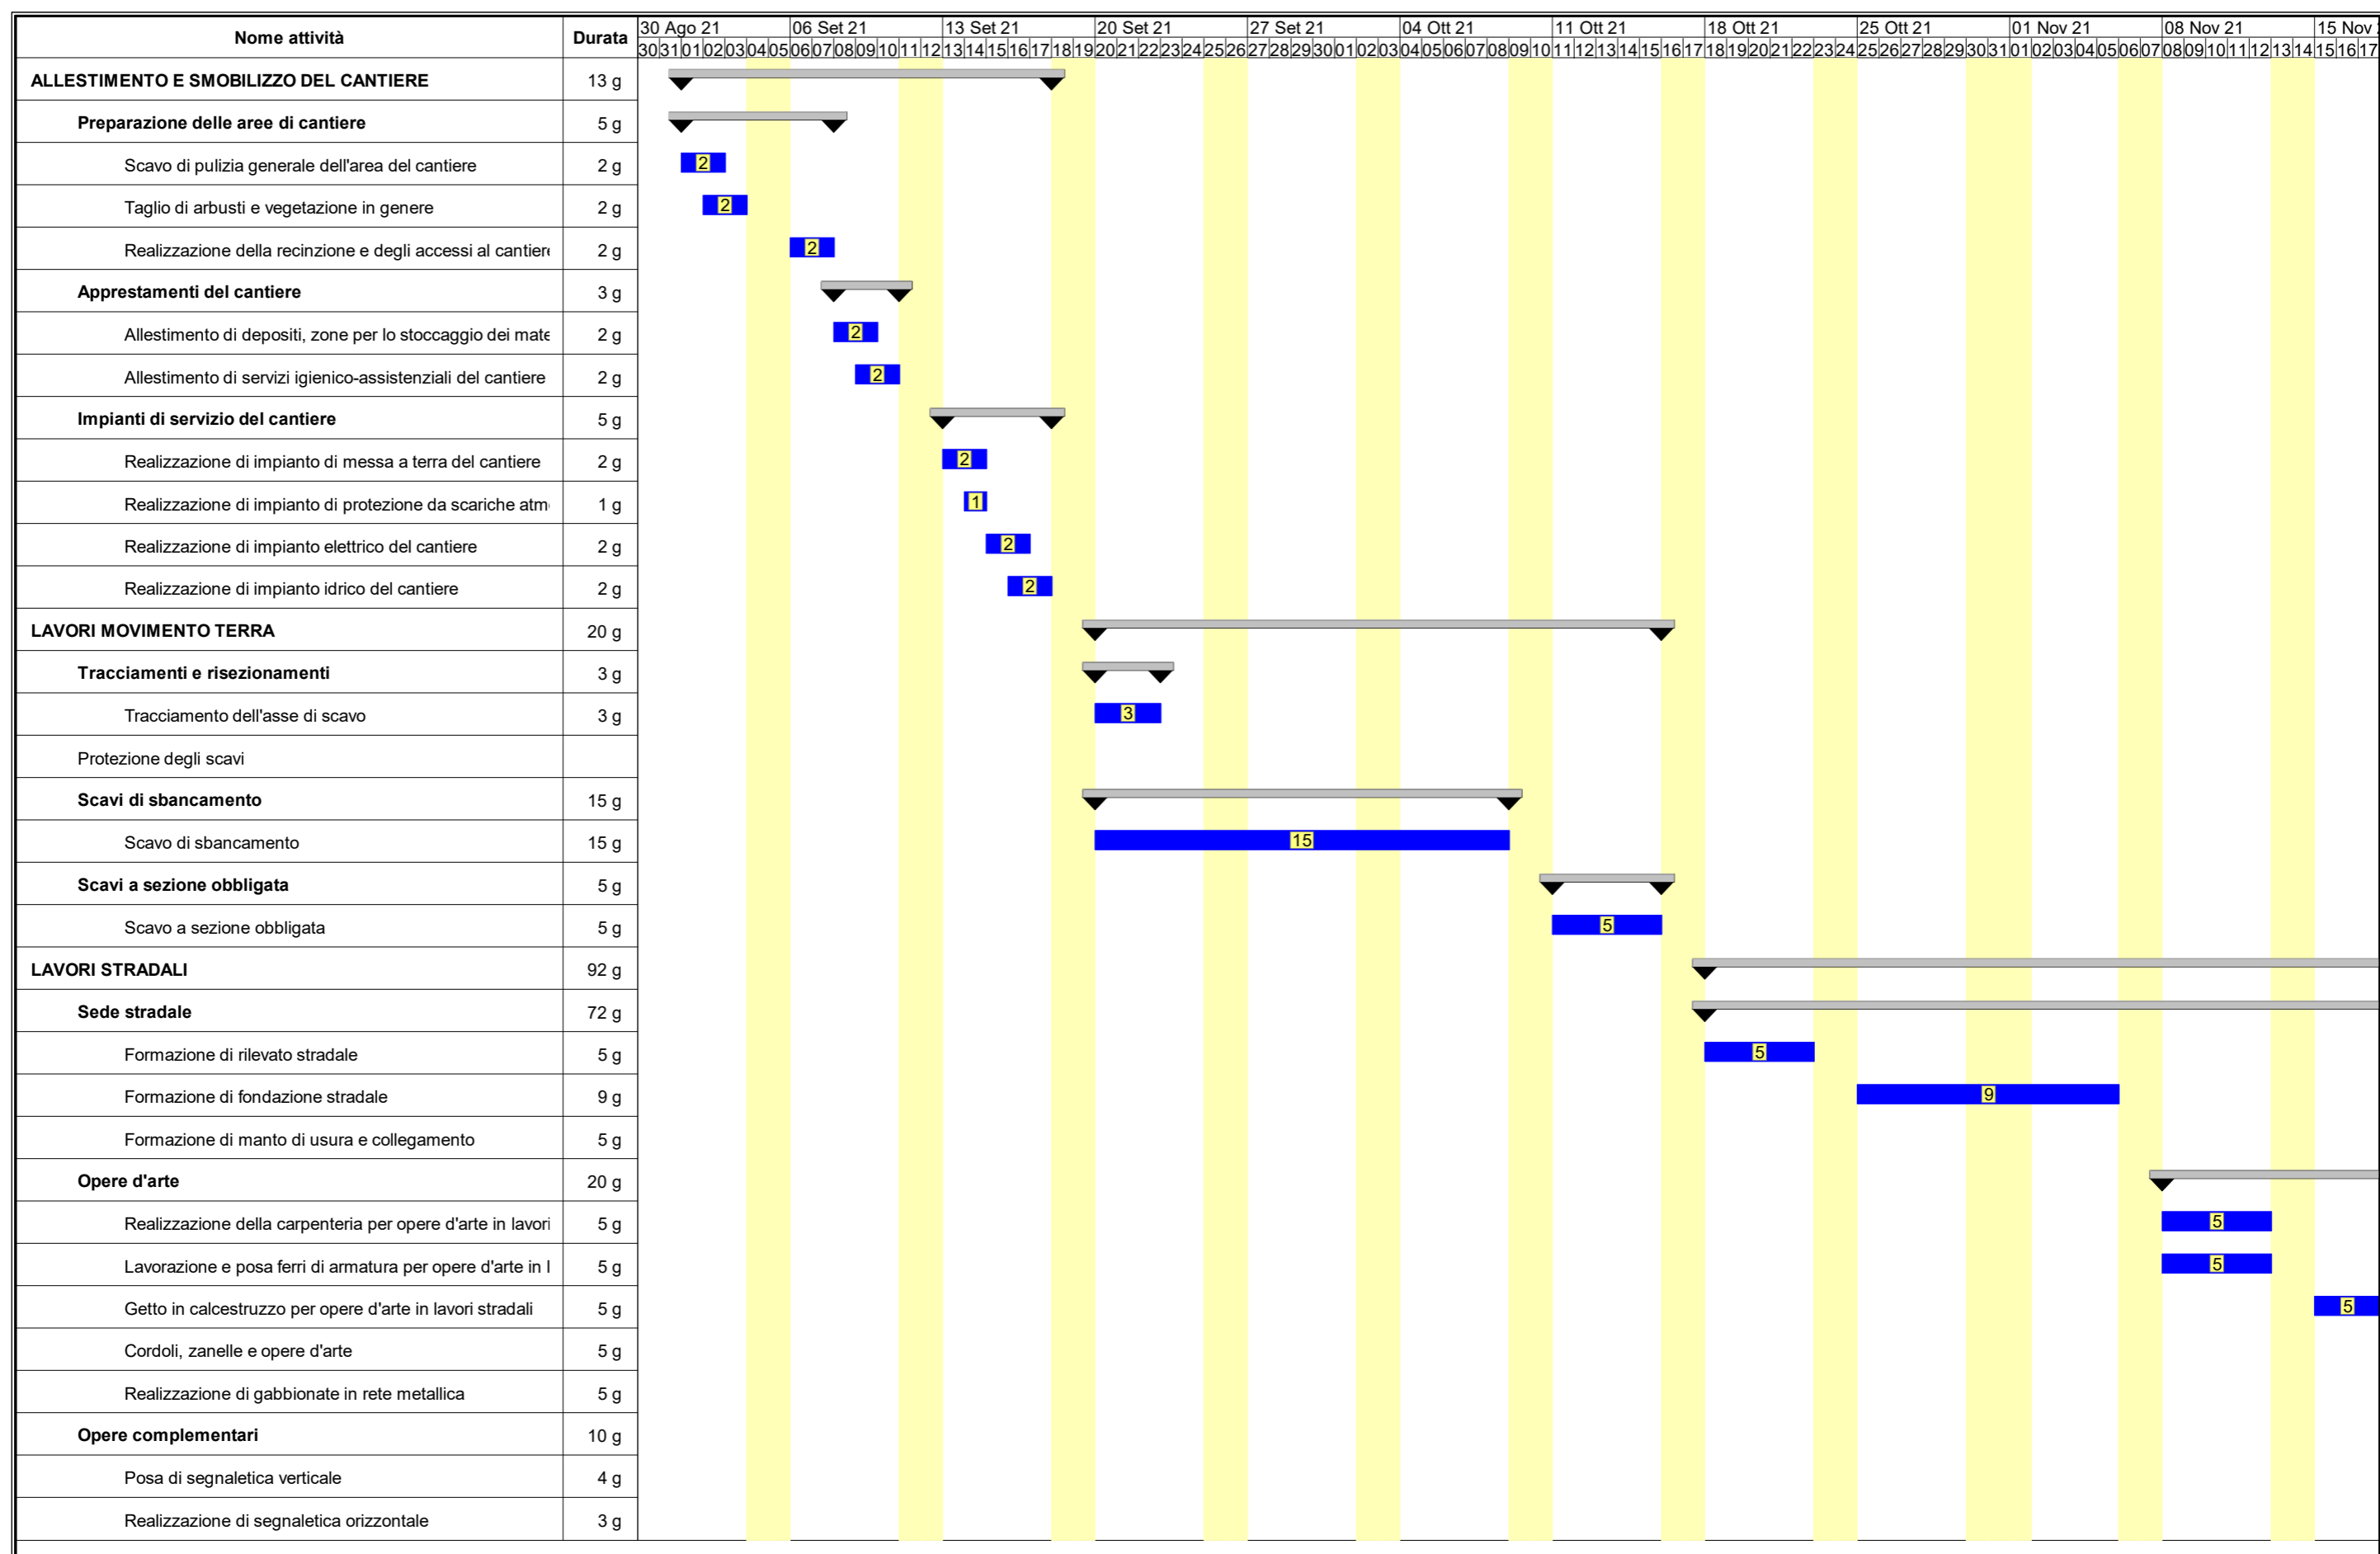

Nome attività	Durata	30 Ago 21	06 Set 21	13 Set 21	20 Set 21	27 Set 21	04 Ott 21	11 Ott 21	18 Ott 21	25 Ott 21	01 Nov 21	08 Nov 21	15 Nov 21							
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Pulizia di sede stradale	1 g																			
LAVORI DI URBANIZZAZIONE	23 g																			
ACQUEDOTTI	2 g																			
Posa di condotta idrica in materie plastiche	2 g																			
FOGNATURE	3 g																			
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	3 g																			
IMPIANTI A RETE	23 g																			
Opere d'arte	10 g																			
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	5 g																			
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g																			
Impianti a rete	17 g																			
Posa di condotta elettrica	4 g																			
Posa di condotta idrica	1 g																			
Posa di condotta fognaria	1 g																			
Esecuzione di protezioni elettriche	4 g																			
VASCHE IN C.A.	3 g																			
Posa di fossa biologica prefabbricata	3 g																			
OPERE EDILI IN GENERE	38 g																			
Massetti e sottofondi	5 g																			
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	5 g																			
Opere in c.a. non strutturale	1 g																			
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strut	1 g																			
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1 g																			
Opere in legno e ferro	2 g																			
Posa di recinzioni e cancellate	1 g																			
Posa di ringhiere e parapetti	1 g																			
Verniciatura a pennello di opere in ferro	2 g																			
Pavimentazioni industriali	1 g																			
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	1 g																			
LAVORI STRUTTURALI	29 g																			
CEMENTO ARMATO	5 g																			
Strutture in fondazione in c.a.	5 g																			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in	4 g																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttur	4 g																			

Nome attività	Durata	30 Ago 21	06 Set 21	13 Set 21	20 Set 21	27 Set 21	04 Ott 21	11 Ott 21	18 Ott 21	25 Ott 21	01 Nov 21	08 Nov 21	15 Nov 21							
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioni	1 g																			
ACCIAIO	14 g																			
Strutture principali in acciaio	14 g																			
Montaggio di strutture verticali in acciaio	4 g																			
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	5 g																			
Montaggio di copertura in lamiera grecata	5 g																			
IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE ESTERNA	14 g																			
Realizzazione di impianto di messa a terra	3 g																			
Realizzazione di impianto elettrico	3 g																			
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g																			
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g																			
LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA	10 g																			
Rinverdimenti	5 g																			
Messa a dimora di talee e piantine	5 g																			
Scavi e riprofilature del terreno	5 g																			
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con n	5 g																			

